


# Объект, финансируемый МТК РК и АБР в Жамбылской Области

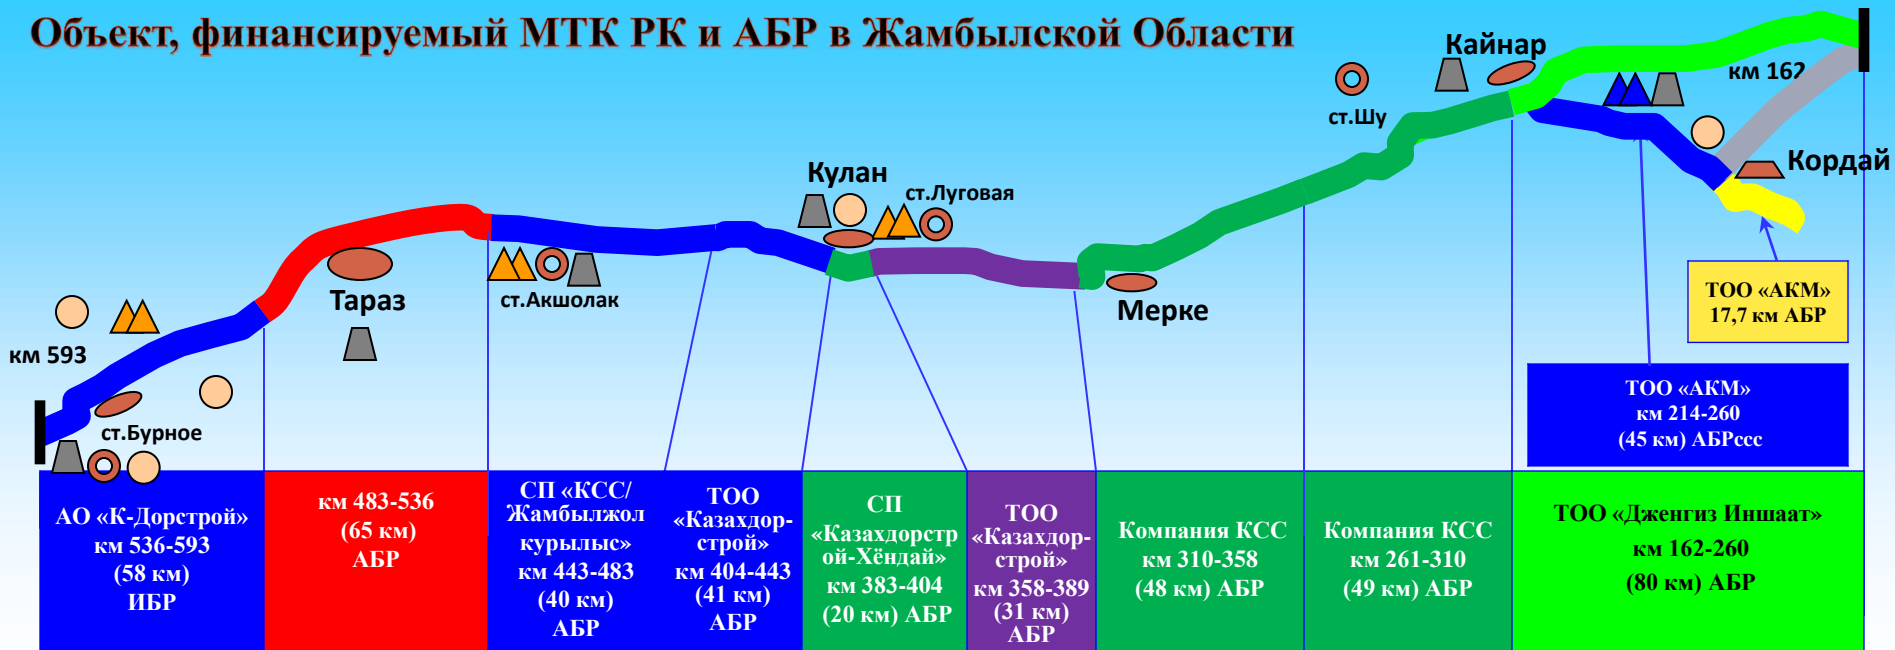

## Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	495 км
4-х полосной	295 км
2-х полосной	200 км
<b>План на текущий год из ц/б, м/з а/б и ЦМА</b>	<b>165,4 км</b>
Мобилизация персонала	7 490 чел.
Мобилизация ДСТ	1 014 ед.

Заготовка материалов	Ед.изм.	План на 2012г.	Факт	%
Щебень	тыс.м <sup>3</sup>	1 139	537	50
ПГС	тыс.м <sup>3</sup>	2 233	1 040	47
Ж/б изделия	тыс.м <sup>3</sup>	25	12	48

## График производства работ

Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту	Выполнено до 2012г.	План на 2012 год
Покрытие из ц/б	км	343	132	122
Покрытие из м/з а/б и ЦМА	км	87	16,6	43,4
Устройство основания	км	430	197	133
Земляные работы	млн.м <sup>3</sup>	27,3	12,6	9,2
Водопропускные трубы	шт.	561	312	174
Мосты и путепроводы	шт.	38	15	14
